

**Procedura volta alla realizzazione di un nuovo sistema informatico, denominato “G.U.S.-N.”, finalizzato all’automazione dei processi di raccolta, condivisione ed elaborazione dei dati nazionali concernenti la gestione degli Uffici Sanitari della Polizia di Stato**


## **Capitolato di Gara**

### **ALLEGATO C**

# **Dettaglio Fasi Progettuali**

## Ambito della Fornitura – Fasi Progettuali<sup>1</sup>

L'insieme delle attività costituenti l'Ambito della Fornitura del Progetto GUS-N sono contenute nelle tre fasi progettuali sotto evidenziate.

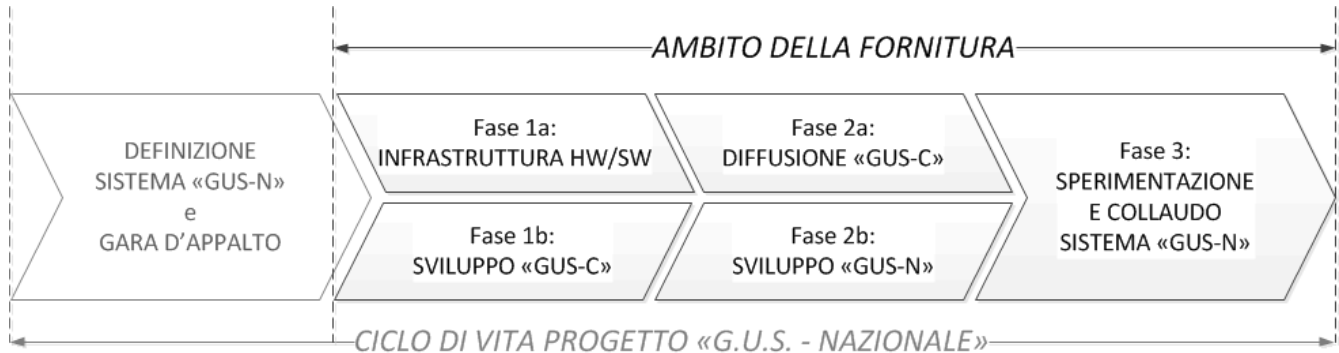

Per ognuna delle fasi progettuali, nel seguito viene riportata una tabella contenente l'insieme di tutte le attività previste, costituenti i diversi WP della WBS, le loro reciproche dipendenze, la loro durata ed il livello di coinvolgimento richiesto al Fornitore per ognuna di queste, evidenziato sotto forma di matrice RACI.

Si precisa che, al momento, le attività sono individuate con un basso livello di dettaglio e dovranno essere oggetto di una più approfondita scomposizione, in una successiva e più attenta fase di pianificazione, successiva alla stipula del contratto (Piano di Progetto definitivo).

### Le strutture coinvolte nel progetto

I soggetti coinvolti nel progetto GUS-N sono, principalmente, la Direzione Centrale di Sanità (**DCS**) e tutti gli Uffici Sanitari della Polizia di Stato (**UOSS**) presenti sul territorio nazionale, in veste di clienti finali, oltre che le strutture di seguito elencate:

- Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato – Ufficio per l'Informatizzazione e l'Innovazione Tecnologica (**UIIT**);
- Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato (**CEN**);
- Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale – Ufficio Attività Contrattuale per l'Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni (**UAT**), precedentemente denominato Ufficio Impianti Tecnici, Telecomunicazione ed Informatica.

<sup>1</sup> Si precisa che in questo documento viene utilizzata diffusamente la terminologia propria delle metodologie di Project Management.

**Fase 1: Centralizzazione del Sistema GUS**

Codice WBS	ID	Nome	Descrizione Attività	Predecessori	Durata (gg. lav.)	Matrice RACI					
						DCS	UUSS	UIIT	CEN	UAT	Fornitore
<b>1.</b>	<b>1</b>	<b>CENTRALIZZAZIONE SISTEMA GUS</b>									
	<b>2</b>	INIZIO FASE	<i>Milestone</i>		0						
<b>1.1</b>	<b>3</b>	UFFICIO AMM. GUS-N c/o DCS									
	<b>4</b>	Organizzare Ufficio	Attività mirata ad organizzare uno specifico Ufficio, all'interno della Direzione Centrale di Sanità, che si occuperà di amministrare il GUS-N: questa attività comprende sia le problematiche amministrative (organigramma, personale, etc.) che quelle logistiche.	33	20	fuori l'ambito della fornitura					
	<b>5</b>	Definire Ruoli e Procedure	Attività mirata a definire i ruoli, le responsabilità e le procedure per la completa gestione funzionale del GUS-N (utenze, modulistica, help desk, etc.)	4	20						
<b>1.2</b>	<b>6</b>	INFRASTRUTTURA HW/SW									
<b>1.2.1</b>	<b>7</b>	Infrastruttura HW									
	<b>8</b>	Installaz. e Config. HW	Attività mirata ad installare e configurare tutte le componenti hardware costituenti l'infrastruttura HW/SW del GUS-N (ampliamento del CEN).	33	a.c.f.			I	R		A/R
	<b>9</b>	Validazione HW	Attività mirata a validare l'installazione e configurazione delle componenti hardware costituenti l'infrastruttura HW/SW del GUS-N.	8	a.c.f.			I	A/R		C
<b>1.2.2</b>	<b>10</b>	Infrastruttura SW									
	<b>11</b>	Installaz. e Config. SW	Attività mirata ad installare e configurare tutte le componenti software costituenti l'infrastruttura HW/SW del GUS-N (ampliamento del CEN).	9	a.c.f.			I	R		A/R
	<b>12</b>	Validazione SW	Attività mirata a validare l'installazione e configurazione delle componenti software costituenti l'infrastruttura HW/SW del GUS-N.	11	a.c.f.			I	A/R		C

Codice WBS	ID	Nome	Descrizione Attività	Predecessori	Durata (gg. lav.)	Matrice RACI					
						DCS	UUSS	UIIT	CEN	UAT	Fornitore
<b>1.3</b>	<b>13</b>	AMBIENTE SW GUS-C									
<b>1.3.1</b>	<b>14</b>	Piattaforma SW									
	<b>15</b>	Allestire Ambiente Test	Attività mirata a installare presso il CEN di Napoli tutto l'ambiente hardware e software di Test, su cui verrà installato, per finalità di test e validazione pre-collauda, inizialmente l'applicativo GUS-C, e successivamente, il GUS-N. Al termine del progetto questo ambiente verrà utilizzato per l'attività di formazione.	12	a.c.f.			I	C		A/R
	<b>16</b>	Allestire Ambiente Esercizio	Attività mirata a installare presso il CEN di Napoli tutto l'ambiente hardware e software di Esercizio, su cui verrà installato inizialmente l'applicativo GUS-C, e successivamente, il GUS-N. Su questo ambiente verrà eseguito il collaudo funzionale sia dell'applicativo GUS-C che del GUS-N	21	a.c.f.			I	C		A/R
	<b>17</b>	Eseguire Test di Carico	Attività mirata a verificare la buona tenuta dell'ambiente di Esercizio, e dell'applicativo GUS-C, sollecitato da una utenza numericamente pari o superiore a quella prevista a regime per il GUS-N	24	a.c.f.			I	C		A/R
<b>1.3.2</b>	<b>18</b>	Applicativo SW									
	<b>19</b>	Apprendere GUS	Attività mirata ad assumere la piena conoscenza del funzionamento dell'applicativo GUS, tramite l'analisi dettagliata del suo codice sorgente.	33	a.c.f.	C		I			A/R
	<b>20</b>	Sviluppare GUS-C *	Attività mirata allo sviluppo del GUS-C (Progettazione – Codifica – Test)	19; 27; 29	a.c.f.			I			A/R
	<b>21</b>	Testare/Validare GUS-C *	Attività mirata a testare e validare funzionalmente l'applicativo GUS-C	23	15	A/R		R			R/C
	<b>22</b>	Rilasciare GUS-C									
	<b>23</b>	Rilasciare in Amb. Test *	Attività mirata a rilasciare in Ambiente di Test presso il CEN, l'applicativo GUS-C	20	a.c.f.	I		I			A/R

Codice WBS	ID	Nome	Descrizione Attività	Predecessori	Durata (gg. lav.)	Matrice RACI					
						DCS	UUSS	UIIT	CEN	UAT	Fornitore
	24	Rilasciare in Amb. Esercizio	Attività mirata a rilasciare in Ambiente di Esercizio/Produzione presso il CEN, l'applicativo GUS-C	16	a.c.f.	I		I			A/R
1.4	25	POSTAZIONI REMOTE									
1.4.1	26	Postazione Remota c/o DCS									
	27	Predisporre Postazione DCS	Attività mirata a predisporre una postazione di lavoro informatica presso la Direzione Centrale di Sanità, connesse con il sistema di Napoli, tramite le quali svolgere tutte le funzioni tecniche di amministrazione ipotizzabili da remoto	15	a.c.f.	A/R		I	C		R
1.4.2	28	Postazione Remota c/o UPS									
	29	Predisporre Postazione UPS	Attività mirata a predisporre una postazione di lavoro informatica, presso un Ufficio Sanitario (o altro Ufficio della Polizia di Stato) presente sul territorio nazionale, connessa con il sistema di Napoli, tramite la quale svolgere tutte le funzioni tecniche di amministrazione ipotizzabili da remoto; tale attività sarà svolta solo se richiesta esplicitamente dal Fornitore	15	a.c.f.	A/R	R	I	C		R
1.5	30	GESTIONE CONTRATTO									
1.5.1	31	Piano di Progetto definitivo									
	32	Definizione Piano di Progetto	Attività, svolta congiuntamente tra tutti i soggetti aventi ruolo di responsabilità attuativa nel Progetto, mirata alla dettagliata definizione del Piano di Progetto definitivo	2	9	C		C	C		A/R
	33	Approvazione Piano di Progetto	Formale approvazione del Piano di Progetto definitivo da parte della Amministrazione	32	1	I		A/R		I	I
1.5.2	34	Stato Avanzamento Lavori									
	35	Eseguire Audit Amb. Sviluppo **	Attività mirata a verificare l'andamento dello sviluppo del GUS-C, tramite audit sull'ambiente di sviluppo,	20II;	4			A/R			C

Codice WBS	ID	Nome	Descrizione Attività	Predecessori	Durata (gg. lav.)	Matrice RACI					
						DCS	UUSS	UIIT	CEN	UAT	Fornitore
			anche se presente presso la sede del Fornitore.	23IF							
	36	Stabilire SAL ***	Attività mirata a stabilire il contenuto dei resoconti sullo stato di avanzamento del lavoro che dovranno essere emessi dal Fornitore, e la periodicità con cui questi dovranno essere emessi.	33	1	C		A/R			R
	37	Fornire SAL ***	Attività ciclica di emissione dei resoconti sullo stato di avanzamento del lavoro; potrebbe prevedere un incontro tra le parti	36; 39IF	5	I		A			R
1.5.3	38	Verifica Fornitura									
	39	Validare deliverable di fase	Attività mirata a validare formalmente tutti i deliverable prodotti nella fase progettuale, per dare via libera al Fornitore per la comunicazione di fine attività (Pronti al Collaudo)	17	1	R		A/R	I		C
	40	Comunicare Pronti-Collaudo	Viene prodotta la comunicazione di fine attività, propedeutica all'esecuzione del Collaudo di fase	39	1			I		C/I	A/R
	41	Eseguire Collaudo ****	Esecuzione delle attività di collaudo da parte di una commissione a tale scopo nominata	40FI+ 10g	2	C		C	C	I	C
						Commissione di Collaudo: A/R					
1.5.4	42	Avvio Garanzia/Manut. Infr. HW									
	43	Nomina Referenti	Nomina dei referenti, sia lato Amministrazione che Fornitore, responsabili della manutenzione del Sistema, per tutto il suo ciclo di vita	41; 5	1			I	R	A	R
	44	Avvio Garanz./Manut.	Definizione del Piano di Manutenzione: attività mirata alla definizione di tutti gli elementi propedeutici al corretto avvio del Servizio di Manutenzione (definizione procedure, definizione Registro di Manutenzione, etc.).	43	3			I	R	A	R
	45	CHIUSURA FASE	<i>Milestone</i>	44	0						

**Legenda**

**a.c.f. = a cura del fornitore;**

**RACI:**

A = Responsabile decisionale unico (approvazione/validazione),

R = Responsabile esecutivo (totale o parziale),

C = Consulente esecutivo (parere non vincolante),

I = Informato sull'andamento della attività

### **Note**

\* Attività che costituiscono un insieme ciclico che potrà essere ripetuto più volte, nel corso del periodo di tempo per esse complessivamente previsto

\*\* Attività che va interpretata come una singola attività di durata pari ad uno/due giorni, da potersi ripetere più volte nel corso del periodo di tempo per essa complessivamente previsto

\*\*\* Attività che costituiscono un insieme ciclico che potrà essere ripetuto più volte, nel corso del periodo di tempo per esse complessivamente previsto

\*\*\*\* Il collaudo, per l'esecuzione del quale è previsto nel crono-programma un ritardo di 10 gg lavorativi rispetto alla comunicazione di fine attività, potrebbe arrivare ad avere un ritardo maggiore; la sua chiusura deve comunque avvenire entro 30 gg solari.

**Fase 2: Diffusione GUS-C / Sviluppo GUS-N**

Codice WBS	ID	Nome	Descrizione Attività	Predecessori	Durata (gg. lav.)	Matrice RACI					
						DCS	UUSS	UIIT	CEN	UAT	Fornitore
<b>2.</b>	<b>1</b>	<b>DIFFUSIONE GUS-C/SVILUPPO GUS-N</b>									
	<b>2</b>	INIZIO FASE	<i>Milestone</i>		0						
<b>2.1</b>	<b>3</b>	DIFFUSIONE GUS-C									
<b>2.1.1</b>	<b>4</b>	Attivazione GUS-C beta									
	<b>5</b>	Migrare dati GUS *	Attività mirata alla migrazione dei dati contenuti nelle diverse banche dati dei sistemi GUS in uso presso gli Uffici Sanitari attualmente utilizzatori (circa 15), nella banca dati del sistema GUS-C	26	a.c.f.	I	R	I			A/R
	<b>6</b>	Formare personale UU.SS. *	Attività mirata alla formazione del personale utilizzatore del sistema GUS, sul nuovo sistema GUS-C	26	5	A/R	R	C			C
	<b>7</b>	Attivare Utenze *	Attività mirata alla creazione ed attivazione delle utenze del GUS-C, presso gli Uffici Sanitari presso cui questo viene diffuso	5; 6	2	A/R	R	C			C
<b>2.1.2</b>	<b>8</b>	Modifiche GUS-C									
	<b>9</b>	Raccogliere RM ***	Attività mirata alla raccolta di eventuali Richieste di Modifica (RM), sia correttive che adeguate, provenienti dagli Uffici Sanitari utilizzatori del sistema GUS-C	7	5	A/R	R	I			
	<b>10</b>	Analizzare RM ***	Attività di analisi degli impatti dovuti all'esecuzione di una richiesta di modifica adeguata pervenuta da un Ufficio Sanitario	9	5	C	C	R			A/R
	<b>11</b>	Approvare RM ***	Approvazione di una richiesta di modifica, sia correttiva che adeguata, pervenuta da un Ufficio Sanitario	10	5	A/R		I			I
<b>2.2</b>	<b>12</b>	APPLICATIVO GUS-N									



Codice WBS	ID	Nome	Descrizione Attività	Predecessori	Durata (gg. lav.)	Matrice RACI					
						DCS	UUSS	UIIT	CEN	UAT	Fornitore
<b>2.2.1</b>	<b>13</b>	Sviluppo GUS-N beta									
	<b>14</b>	Sviluppare GUS-N **	Attività mirata allo sviluppo del GUS-N a partire dal GUS-C	26	a.c.f.			I			A/R
	<b>15</b>	Rilasciare in Amb. Test **	Attività mirata a rilasciare in Ambiente di Test l'applicativo GUS-N	14	a.c.f.			I			A/R
	<b>16</b>	Testare/Validare GUS-N **	Attività mirata a testare e validare funzionalmente l'applicativo GUS-N	15	15	A/R		R			C
	<b>17</b>	Rilasciare in Amb. Eserc.	Attività mirata a rilasciare in Ambiente di Esercizio l'applicativo GUS-N	16	a.c.f.	I		I			A/R
<b>2.2.2</b>	<b>18</b>	Modifiche GUS-C									
	<b>19</b>	Sviluppare Modifiche ***	Attività mirata allo sviluppo di una modifica approvata al GUS-C	11	a.c.f.			I			A/R
	<b>20</b>	Rilasciare Amb. Test ***	Attività mirata a rilasciare in Ambiente di Test presso il CEN, la modifica sviluppata al GUS-C	19	a.c.f.			I			A/R
	<b>21</b>	Testare/Validare Modifiche ***	Attività mirata a testare e validare funzionalmente una modifica al GUS-C	20	10	A/R		R			C
	<b>22</b>	Rilasciare in Amb. Esercizio ***	Attività mirata a rilasciare in Ambiente di Esercizio presso il CEN, la modifica sviluppata al GUS-C	21	a.c.f.	I		I			A/R
<b>2.3</b>	<b>23</b>	GESTIONE CONTRATTO									
<b>2.3.1</b>	<b>24</b>	Revisione Piano di Progetto									
	<b>25</b>	Aggiornare Piano di progetto	Attività, svolta congiuntamente tra tutti i soggetti aventi ruolo di responsabilità attuativa nel Progetto, mirata alla revisione ed eventuale aggiornamento del Piano di Progetto definitivo, prima dell'avvio della fase	2	4	C		C	C		A/R
	<b>26</b>	Approvare Piano di Progetto Agg.	Formale approvazione del Piano di Progetto definitivo, rivisto ed aggiornato, da parte della Amministrazione	25	1	I		A/R	I	I	I
<b>2.3.2</b>	<b>27</b>	Stato Avanzamento Lavori									

Codice WBS	ID	Nome	Descrizione Attività	Predecessori	Durata (gg. lav.)	Matrice RACI					
						DCS	UUSS	UIIT	CEN	UAT	Fornitore
	28	Eseguire Audit Amb. Sviluppo ****	Attività mirata a verificare l'andamento dello sviluppo del GUS-N, tramite audit sull'ambiente di sviluppo presente presso la sede del Fornitore	14II; 15IF	4			A/R			C
	29	Stabilire SAL *****	Attività mirata a stabilire il contenuto dei resoconti sullo stato di avanzamento del lavoro che dovranno essere emessi dal Fornitore, e la periodicità con cui questi dovranno essere emessi.	26	1	C		A/R			R
	30	Fornire SAL *****	Attività ciclica di emissione dei resoconti sullo stato di avanzamento del lavoro	29; 32IF	5	I		A			R
2.3.3	31	Validazione Fornitura									
	32	Validare deliverable di fase	Attività mirata a validare formalmente tutti i deliverable prodotti nella fase progettuale, per il passaggio alla fase successiva di progetto. Non è previsto un collaudo per questa fase di progetto.	17; 22	1	R		A/R	I	I	C
	33	CHIUSURA FASE	<i>Milestone</i>	32	0						

### Legenda

**a.c.f. = a cura del fornitore;**

RACI:

A = Responsabile decisionale unico (approvazione/validazione),

R = Responsabile esecutivo (totale o parziale),

C = Consulente esecutivo (parere non vincolante),

I = Informato sull'andamento della attività

### Note

\* Queste attività dovranno essere ripetute per tutti gli Uffici Sanitari dove è attualmente in uso il sistema GUS.

\*\* Queste attività costituiscono un insieme ciclico che potrà essere ripetuto più volte, nel corso del periodo di tempo per esse complessivamente previsto

\*\*\* Queste attività costituiscono un insieme ciclico che potrà essere ripetuto più volte, nel corso del periodo di tempo per esse complessivamente previsto

\*\*\*\* Attività va interpretata come una singola attività di durata pari ad uno/due giorni, da potersi ripetere più volte nel corso del periodo di tempo per essa complessivamente previsto

\*\*\*\*\* Queste attività costituiscono un insieme ciclico che potrà essere ripetuto più volte, nel corso del periodo di tempo per esse complessivamente previsto

**Fase 3: Sperimentazione e Collaudo Sistema GUS-N**

Codice WBS	ID	Nome	Descrizione Attività	Predecessori	Durata (gg. lav.)	Matrice RACI					
						DCS	UUSS	UIIT	CEN	UAT	Fornitore
<b>3.</b>	<b>1</b>	<b>SPERIMENTAZIONE E COLLAUDO SISTEMA GUS-N</b>									
	<b>2</b>	INIZIO FASE	<i>Milestone</i>		0						
<b>3.1</b>	<b>3</b>	APPLICATIVO GUS-N									
<b>3.1.1</b>	<b>4</b>	GUS-N beta									
	<b>5</b>	Disattivare GUS-C	Attività amministrativa e tecnica mirata a rendere indisponibile il GUS-C agli Uffici Sanitari, al fine di congelare la sua base dati	17	a.c.f.	R	I	A/R	C		R
	<b>6</b>	Migrare dati GUS-C	Attività mirata alla migrazione della base dati del GUS-C in quella del GUS-N	5	a.c.f.	I		I			A/R
	<b>7</b>	Rilasciare Amb. Esercizio	Attività amministrativa e tecnica mirata al rilascio del GUS-N in ambiente di produzione ed alla sua fruizione da parte degli Uffici Sanitari utilizzatori del GUS-C	6	a.c.f.	R	I	A/R	C		R
<b>3.1.2</b>	<b>8</b>	GUS-N Finale									
	<b>9</b>	Testare Beta GUS-N *	Attività mirata a sperimentare tutte le funzioni del GUS-N sul campo	7	20	A/R	R	R			C
	<b>10</b>	Rilevare malfunzionamenti *	Attività mirata alla raccolta ed approvazione di eventuali richieste di modifica correttive provenienti dagli Uffici Sanitari utilizzatori del beta GUS-N	7; 9FF	5	A/R	R	R			C/I
	<b>11</b>	Correggere malfunzionamenti *	Attività mirata alla realizzazione delle modifiche correttive richieste ed approvate	10	a.c.f.			I			A/R
	<b>12</b>	Rilasciare in Amb. Test *	Attività mirata al rilascio, in ambiente di test, delle modifiche realizzate	11	a.c.f.	I		I			A/R
	<b>13</b>	Testare/Validare Modifiche *	Attività mirata a testare, ed eventualmente validare, in ambiente di test, le modifiche rilasciate	12	1	A/R	R	R			C
	<b>14</b>	Rilasciare in Amb. Eserc. *	Attività mirata a rilasciare in ambiente di esercizio le modifiche validate	13	a.c.f.	I	I	I			A/R

Codice WBS	ID	Nome	Descrizione Attività	Predecessori	Durata (gg. lav.)	Matrice RACI					
						DCS	UUSS	UIIT	CEN	UAT	Fornitore
3.2	15	DIFFUSIONE GUS-N									
3.2.1	16	Formazione Personale UU.SS.									
	17	Aggiornare Personale GUS-C	Attività mirata ad aggiornare gli utenti degli Uffici Sanitari utilizzatori del GUS-C sulle nuove funzioni del GUS-N	24	3	fuori l'ambito della fornitura					
	18	Avviare Formazione Generale	Attività di avvio della formazione sul sistema GUS-N, a tutti gli Uffici Sanitari della Polizia di Stato	31	1	fuori l'ambito della fornitura					
3.2.2	19	Attivazione Utenze									
	20	Avviare Attivazione Utenze UU.SS.	Attività di avvio della gestione delle utenze del sistema GUS-N, per tutti gli Uffici Sanitari della Polizia di Stato	31	1	fuori l'ambito della fornitura					
3.3	21	GESTIONE CONTRATTO									
3.3.1	22	Revisione Piano di Progetto									
	23	Aggiornare Piano di progetto	Attività, svolta congiuntamente tra tutti i soggetti aventi ruolo di responsabilità attuativa nel Progetto, mirata alla revisione ed eventuale aggiornamento del Piano di Progetto definitivo, prima dell'avvio della fase	2	4	C		C	C		A/R
	24	Approvare Piano di Progetto	Formale approvazione del Piano di Progetto definitivo, rivisto ed aggiornato, da parte della Amministrazione	23	1	I		A/R	I	I	I
3.3.2	25	Stato Avanzamento Lavori									
	26	Stabilire SAL **	Attività mirata a stabilire il contenuto dei resoconti sullo stato di avanzamento del lavoro che dovranno essere emessi dal Fornitore, e la periodicità con cui questi dovranno essere emessi.	23	1	C		A/R			R
	27	Fornire SAL **	Attività ciclica di emissione dei resoconti sullo stato di avanzamento del lavoro	26; 29IF	5	I		A			R

Codice WBS	ID	Nome	Descrizione Attività	Predecessori	Durata (gg. lav.)	Matrice RACI					
						DCS	UUSS	UIIT	CEN	UAT	Fornitore
3.3.3	28	Verifica Fornitura									
	29	Validare deliverable di fase	Attività mirata a validare formalmente tutti i deliverable prodotti nella fase progettuale, per dare via libera al Fornitore per la comunicazione di fine attività (Pronti al Collaudo)	14	1	R		A/R	I	I	C
	30	Comunicare Pronti-Collaudo	Viene prodotta la comunicazione di fine attività propedeutica all'esecuzione del Collaudo di fase	29	1			I		C/I	A/R
	31	Eseguire Collaudo ***	Esecuzione delle attività di collaudo da parte di una commissione nominata ad hoc	30FI+ 10g	2	C		C	C	I	C
						Commissione di Collaudo: A/R					
3.3.4	32	Avvio Garanzia/Manut. Amb. SW									
	33	Nomina referenti	Nomina dei referenti, sia lato Amministrazione che Fornitore, responsabili della manutenzione degli Ambienti SW, per tutto il suo ciclo di vita	31	1	R		I	I	A	R
	34	Avvio Garanzia/Manutenzione	Definizione del Piano di Manutenzione: attività mirata alla definizione di tutti gli elementi propedeutici al corretto avvio del Servizio di Manutenzione (definizione procedure, definizione Registro di Manutenzione, etc.).	33	4	R		I	I	A	R
	35	CHIUSURA FASE	<i>Milestone</i>	18; 20;34	0						

### Legenda

a.c.f. = a cura del fornitore

RACI:

- A = Responsabile decisionale unico (approvazione/validazione),
- R = Responsabile esecutivo (totale o parziale),
- C = Consulente esecutivo (parere non vincolante),
- I = Informato sull'andamento della attività

**Note**

\* Queste attività costituiscono un insieme ciclico che potrà essere ripetuto più volte, nel corso del periodo di tempo per esse complessivamente previsto

\*\* Queste attività costituiscono un insieme ciclico che potrà essere ripetuto più volte, nel corso del periodo di tempo per esse complessivamente previsto

\*\*\* Il collaudo, per l'esecuzione del quale è previsto nel crono-programma un ritardo di 10 gg lavorativi rispetto alla comunicazione di fine attività, potrebbe arrivare ad avere un ritardo maggiore; la sua chiusura deve comunque avvenire entro 30 gg solari.
